Skoleplassen nærmiljøanlegg Holand

Status pr. 08/02/25




Om SFK Ajaks

SFK Ajaks er idrettslaget på Kleiva, lokalisert 9 km utenfor Sortland. Klubben er en liten bygdeklubb med ca 200 medlemmer, og drives 100% på frivillig basis. Har for tiden ikke organiserte treningsgrupper, men tilbyr ulike aktivitetstilbud i bygda. Ski er den største aktiviteten. Klubben arrangerer skikarusell (10 uker gjennom vinteren) og er medarrangør av turrennet Langøyløpet. Klubben bruker vi mye tid og ressurser på løypenettet mellom Sortland og Kleiva. Her prepareres mange kilometer løypenett, både for ski og annen ferdsel. Dette gjøres i samarbeid med Sortland og omegn skiklubb.

Prosjektet

I 2020 ble barneskolen i bygda vedtatt lagt ned, i 2022 ble skolebygget revet. Med dette mistet bygda sitt naturlige samlingspunkt for barn og unge. Når skolen ble borte, var kommunen positiv til at bygda kunne få disponere området. SFK Ajaks inngikk da en 30 år leieavtale med Sortland kommune på den gamle skoletomta. Klubben fikk støtte av Nordland idrettskrets/anleggsfondet for å gjennomføre et forprosjekt, og høsten 2023 var klubben i gang med å realisere det som skal bli Vesterålens flotteste nærmiljøanlegg.

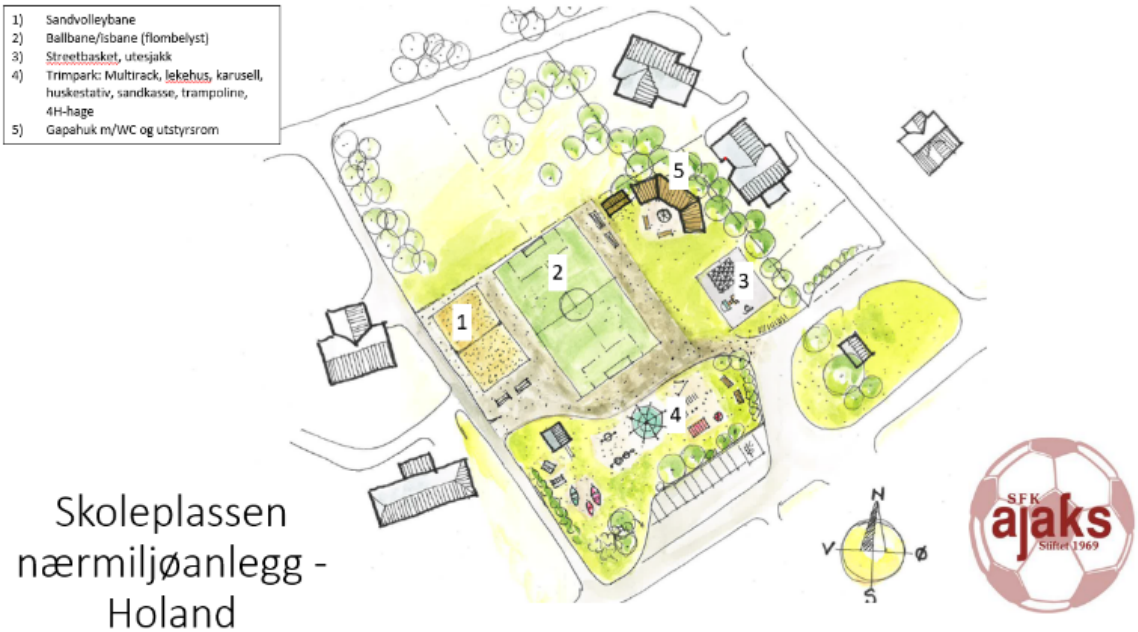

Et anlegg som dette vil bli et svært viktig tilbud for barn og unge i bygda. Nærmiljøanlegget vil ha tilbud til flere aldersgrupper, og vil gjøre bygda attraktiv å bo i. Et nærmiljøanlegg skal bare unntaksvis benyttes til organisert idrett, anlegget vil derfor til enhver tid være tilgjengelig for mange barn og unge. Anslagsvis vil det være ca 500 brukere av anlegget, i all hovedsak vil dette være barn og unge.

Nærmiljøanlegget er delt opp i syv ulike anlegg, og etablert i anleggsregistret:

Anlegg

Navn	Kategori	Beskrivelse	Status	Anleggsnu
Skoleplassen nærmiljøanlegg sandvolleyballbane	Mindre utendørsanlegg	Sandvolleyballbane	Planlagt	81943
Skoleplassen nærmiljøanlegg Ball/Isbane	Aktivitetspark	Ballareal (aktivitetspark)	Planlagt	81944
Skoleplassen nærmiljøanlegg Lysanlegg	Aktivitetspark	Ballareal (aktivitetspark)	Planlagt	81945
Skoleplassen nærmiljøanlegg servicebygg	Idrettshus og servicebygg	Sanitæranlegg (frittstående)	Planlagt	81946
Skoleplassen nærmiljøanlegg trimpark	Mindre utendørsanlegg	Trimpark	Planlagt	81947
Skoleplassen nærmiljøanlegg streetbasket	Mindre utendørsanlegg	Liten balløkke/-bane	Planlagt	81948

Dugnadsinnsats

Bygda består av mange ressurspersoner som stiller opp på dugnad, så langt er det det lagt ned ca. 800 dugnadstimer. Anlegget vil i all hovedsak bli bygd på dugnad.

Største anleggsmaskiner har blitt inn fra lokal maskinentreprenør, øvrig maskiner (mindre gravemaskiner, traktorer) stilles som en del av dugnadsinnsatsen.





Fremdrift

Høsten 2023 ble det meste av grunnarbeidene utført:

- uttrauing av ca 700 m3 masse
- rydding skog
- lagt dreneringsrør/kummer
- innkjøring av drenerende masser (kult/singel)
- avløp/vannforsyning
- el. forsyning flombelysning
- anskaffet/montert lysmaster for flombelysning.









Vår 2024 ble sandvolleybanen ferdigstilt, i løpet av sommer 2024 ble grovbygget til servicebygg/ gapahuk reist.

Høst 2024 er planen å ferdigstille elektriske installasjoner for gapahuk. Dette omfatter styring flomlys, samt el. installasjon (lys/stikk).
Det som da gjenstår er streetbasket, trimpark og ferdigstillelse av is-/ballbane (kunstgress)

Tidspunkt for ferdigstillelse vil være avhengig av om/når vi mottar ytterligere økonomisk støtte.

Økonomi
Prosjektet har en budsjettramme på 2.350.000

Budsjett:	
Grunnarbeider	600.000
Sandvolleybane, sand/div utsyr	200.000
Ball/ isbane	500.000 (kunstgress)
Gapahuk/servicebygg	300.000
Streetbasket-/sjakkbane	150.000
Trimpark	300.000
Elektrisk anlegg/ flomlys	200.000
Vanningsanlegg	100.000
Sum	**kr 2.350.000**

Finansiering:	
Spillemidler:	1.175.000
Dugnad:	500.000
Sponsorer/øvrige økonomisk støtte	675.000
Sum	**kr. 2.350.000**

VVS-installasjoner, lekeapparat trimpark og streetbasket stativ er ikke inkludert i dette beløpet.

Det ble i 2023 søkt om spillemidler for fem av de seks del-anleggene, og klubben fikk i 2024 tilslag/støtte for følgende:

Anlegg 81946	Servicebygg/gapahuk	130.000 kr
Anlegg 81943	Sandvolleybane	139.000 kr
Anlegg 81945	Lysanlegg	79.000 kr

Av annen sponsorstøtte har vi mottatt kr 80.000. Bidragene omfatter både kontantbeløpt og materiellleveranser.

Klubben hadde noe oppsparte midler, dette har gjort at vi har kommet veldig godt i gang med prosjektet. Klubben har så langt brukt ca kr. 940.000, men nå er klubbkassen rimelig bunnskrapt. Vedlagt regnskap for prosjektet.

Gjenstående innkjøp/anskaffelser

- 80 m3 fyllmasser (til streetbasket). Budsjett 30.000
- Innleie gravmaskin/valse, anslagsvis 80 t. Ferdigstille grunnarbeid is-/ballbane. Budsjett 60.000
- 100 m3 finere fyllmasse/grus. Til bruk på is-/ballbane og gangveier. Budsjett 40.000
- Kunstgress 20 x 30 m. Budsjett 400.000
- VVS installasjoner/materiell til servicebygg/gapahuk. Budsjett 60.000
- El-installasjon gapahuk. Budsjett 50.000
- Streetbasket stativ. Budsjett 25.000
- Asfaltering streetbasket + rundt is-/ballbane. Budsjett 150.000
- Lekeapparater til trimpark. Budsjett 100.000

Leverandører

Prosjektet benytter så langt som mulig kun lokale leverandører:

Bulldozer maskinlag, Sortland:	forprosjekt, geo-undersøkelser, transport
Henriksen maskinstasjon, Sortland:	innleie gravemaskin
Oddvar Andreassen, Hadsel:	levering fyllmasser
XL-bygg, Sortland:	byggvare til servicebygg/gapahuk
Ahlsell, Sortland:	rørdeler
Felleskjøpet, Sortland:	Rør
El-team, Sortland:	el-installasjoner
Elektroinstallasjon, Sortland:	el-installasjoner
Blikkenslager Erling Johnsen, Sortland	beslag
Bergård-Amundsen, Sortland	innkjøp flomlys

Drift av anlegget

Anlegget vil bli driftet på dugnad (arbeid)
Vedlikehold vil bli dekket over driften til SFK Ajaks
Årlige strømutgifter: kr 15.000
