
Sortland Flerbrukshall - Hovedfremdriftsplan.

CONSTO

ID	Tekst 1	ETG	AKTIVITET	VAR.	Start	Slutt
1			**Sortland Flerbrukshall. Innledende fase**	553 d?	ti 30.09.25	to 09.03.28
2			**Innlevering forprosjekt**	0 d	ti 30.09.25	ti 30.09.25
4			**Kontraktsinngåelse**	0 d	fr 07.11.25	fr 07.11.25
6			**Godkjent regulering**	0 d	fr 19.12.25	fr 19.12.25
8			**Rammesøknad**	0 d	to 26.03.26	to 26.03.26
10			**Prosjektering**	90 d	fr 27.03.26	to 10.09.26
12			**Opsjon Basishall må avropes**	0 d	fr 27.03.26	fr 27.03.26
14			**Igangsetting på byggeplass**	0 d	fr 03.07.26	fr 03.07.26
16			**Rigging byggeplass**	5 d?	fr 03.07.26	to 06.08.26
18			**Råbygg**	120,33 d?	to 28.05.26	to 10.12.26
19			**Fjerning vekstjord /rensk til fjell**	25,33 d?	to 28.05.26	fr 03.07.26
21		1	**Grunnarbeider og fundamenter**	55 d?	fr 03.07.26	to 15.10.26
26		1	**Bæresystem**	45 d?	fr 09.10.26	to 10.12.26
31			**Lukking råbygg**	65 d?	fr 27.11.26	ti 09.03.27
32	Akse 01-04	3	**Ventilasjonsrom**	15 d?	fr 27.11.26	to 17.12.26
36	Akse 03-08	1-2	**Forbygg**	35 d?	fr 27.11.26	ti 26.01.27
40		U1-1	**Flerbrukshall**	55 d?	fr 11.12.26	ti 09.03.27
46	Akse 03-08	1-3	**Innvendig råbygg Forbygg**	20 d?	on 27.01.27	ti 23.02.27
50	Akse 01-04	1-3	**Innvendig råbygg Flerbrukshall**	25 d?	on 24.02.27	on 07.04.27
54	Akse 03-08	1-3	**Innredning forbygg**	90 d?	on 24.02.27	ma 09.08.27
59	Akse 01-04	1-2	**Innredning flerbrukshall**	80 d?	to 08.04.27	ma 30.08.27
60	Akse 01-04	1-2	**Innredning**	80 d?	to 08.04.27	ma 30.08.27
62			**Sluttaktiviteter**	60 d?	ti 15.06.27	ma 04.10.27
64			**Utomhus**	44 d?	ma 24.05.27	to 19.08.27
66			**Testing&Verifisering**	45 d?	ti 05.10.27	ma 06.12.27
68			**Overlevering**	**0 d**	**ma 06.12.27**	**ma 06.12.27**
70			**Prøvedrift**	60 d?	ti 07.12.27	to 09.03.28
72			**Innflytting**	0 d	ma 06.12.27	ma 06.12.27
74			**Prøvedrift ferdig**	0 d	to 09.03.28	to 09.03.28

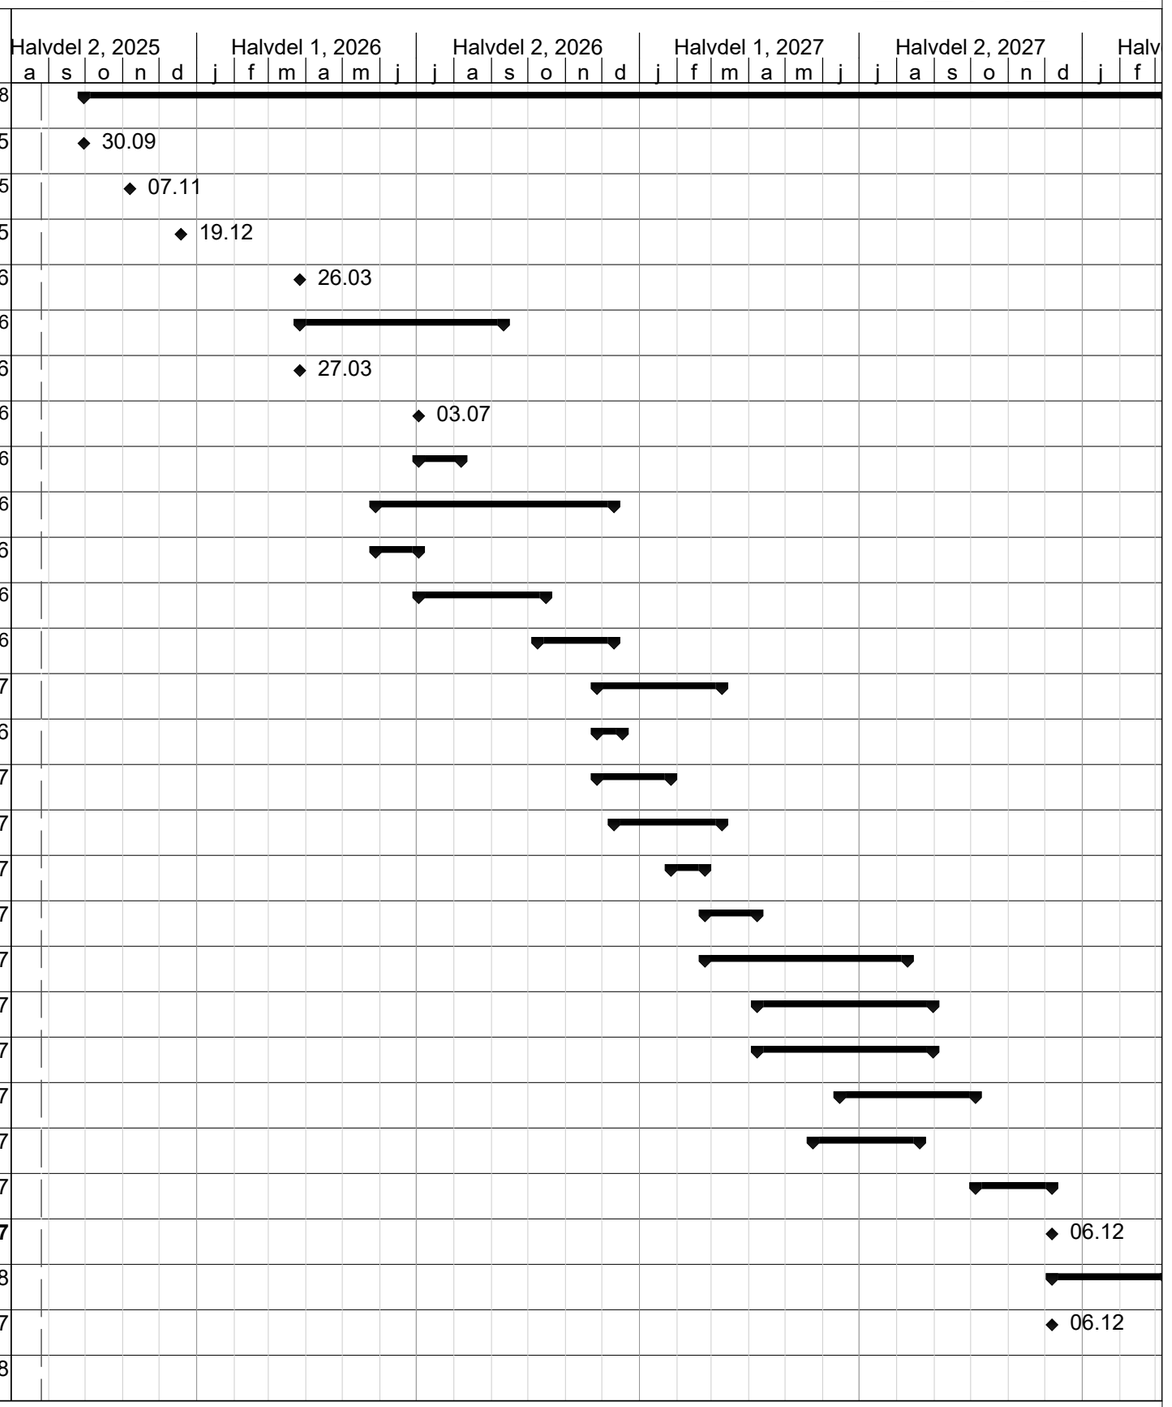

Aktivitet		Deling		Inaktivt sammendrag		Bare slutt	
Milepæl	◆	Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Fremdrift	
Sammendrag		Prosjektsammendrag		Bare varighet		Deadline	⇩
Fremhevet aktivitet		External Milestone	◆	Manuell sammendragsfremheving			
Fremhevet milepæl	◇	Inaktiv aktivitet		Manuelt sammendrag			
Fremhevet fremdrift		Inaktiv milepæl	◇	Bare start			

Revisjon : Hovedfremdriftsplan midlertidig rev.A
Dato 26.08.2025
Utarbeidet av: Ronny Bøckmann og Ida Bordi Stene
