
Sortland Flerbrukshall - Hovedfremdriftsplan.

CONSTO

ID	Tekst 1	ETG	AKTIVITET	VAR.	Start	Slutt
1			**Sortland Flerbrukshall. Innledende fase**	553 d?	ti 30.09.25	to 09.03.28
2			**Innlevering forprosjekt**	0 d	ti 30.09.25	ti 30.09.25
4			**Kontraktsinngåelse**	0 d	fr 07.11.25	fr 07.11.25
6			**Godkjent regulering**	0 d	fr 19.12.25	fr 19.12.25
8			**Rammesøknad**	0 d	to 26.03.26	to 26.03.26
10			**Prosjektering**	90 d	fr 27.03.26	to 10.09.26
12			**Opsjon Basishall må avropes**	0 d	fr 27.03.26	fr 27.03.26
14			**Igangsetting på byggeplass**	0 d	fr 03.07.26	fr 03.07.26
16			**Rigging byggeplass**	5 d?	fr 03.07.26	to 06.08.26
18			**Råbygg**	120,33 d?	to 28.05.26	to 10.12.26
19			**Fjerning vekstjord /rensk til fjell**	25,33 d?	to 28.05.26	fr 03.07.26
21		1	**Grunnarbeider og fundamenter**	55 d?	fr 03.07.26	to 15.10.26
26		1	**Bæresystem**	45 d?	fr 09.10.26	to 10.12.26
31			**Lukking råbygg**	65 d?	fr 27.11.26	ti 09.03.27
32	Akse 01-04	3	**Ventilasjonsrom**	15 d?	fr 27.11.26	to 17.12.26
36	Akse 03-08	1-2	**Forbygg**	35 d?	fr 27.11.26	ti 26.01.27
40		U1-1	**Flerbrukshall**	55 d?	fr 11.12.26	ti 09.03.27
46	Akse 03-08	1-3	**Innvendig råbygg Forbygg**	20 d?	on 27.01.27	ti 23.02.27
50	Akse 01-04	1-3	**Innvendig råbygg Flerbrukshall**	25 d?	on 24.02.27	on 07.04.27
54	Akse 03-08	1-3	**Innredning forbygg**	90 d?	on 24.02.27	ma 09.08.27
59	Akse 01-04	1-2	**Innredning flerbrukshall**	80 d?	to 08.04.27	ma 30.08.27
60	Akse 01-04	1-2	**Innredning**	80 d?	to 08.04.27	ma 30.08.27
62			**Sluttaktiviteter**	60 d?	ti 15.06.27	ma 04.10.27
64			**Utomhus**	44 d?	ma 24.05.27	to 19.08.27
66			**Testing&Verifisering**	45 d?	ti 05.10.27	ma 06.12.27
68			**Overlevering**	**0 d**	**ma 06.12.27**	**ma 06.12.27**
70			**Prøvedrift**	60 d?	ti 07.12.27	to 09.03.28
72			**Innflytting**	0 d	ma 06.12.27	ma 06.12.27
74			**Prøvedrift ferdig**	0 d	to 09.03.28	to 09.03.28

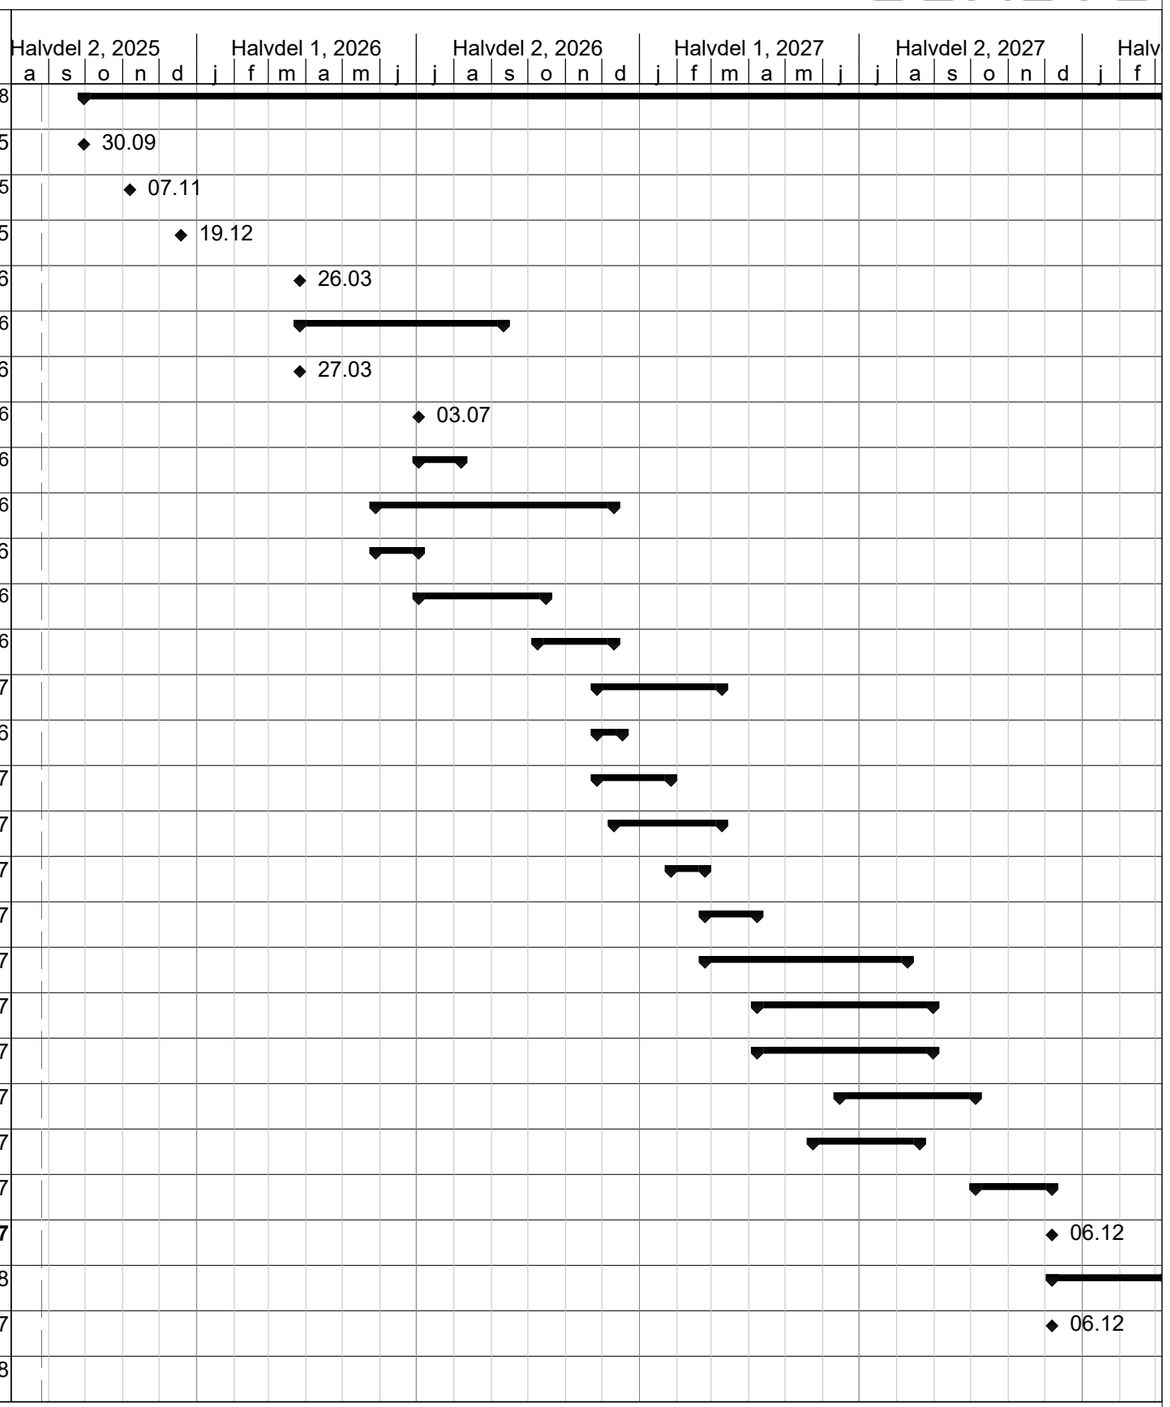

Aktivitet	Deling	Inaktivt sammendrag	Bare slutt
Milepæl	Eksterne aktiviteter	Manuell aktivitet	Fremdrift
Sammendrag	Prosjektsammendrag	Bare varighet	Deadline
Fremhevet aktivitet	External Milestone	Manuell sammendragsfremheving	
Fremhevet milepæl	Inaktiv aktivitet	Manuelt sammendrag	
Fremhevet fremdrift	Inaktiv milepæl	Bare start	

Revisjon : Hovedfremdriftsplan midlertidig rev.A
Dato 26.08.2025
Utarbeidet av: Ronny Bøckmann og Ida Bordi Stene
