040 Markveien, nordre del


- Utførelsesentreprise; kontrakt 15,3 mill ex.mva

- Renovere hovedvei 700 m
- Bygge gang-/sykkelvei med belysning 800 m, for sammenkobling med Nedre Ånstad vei
- Etablere VA 400 m i gang-/sykkelveien

blåbyen

Sortland kommune

Markveien, nordre del

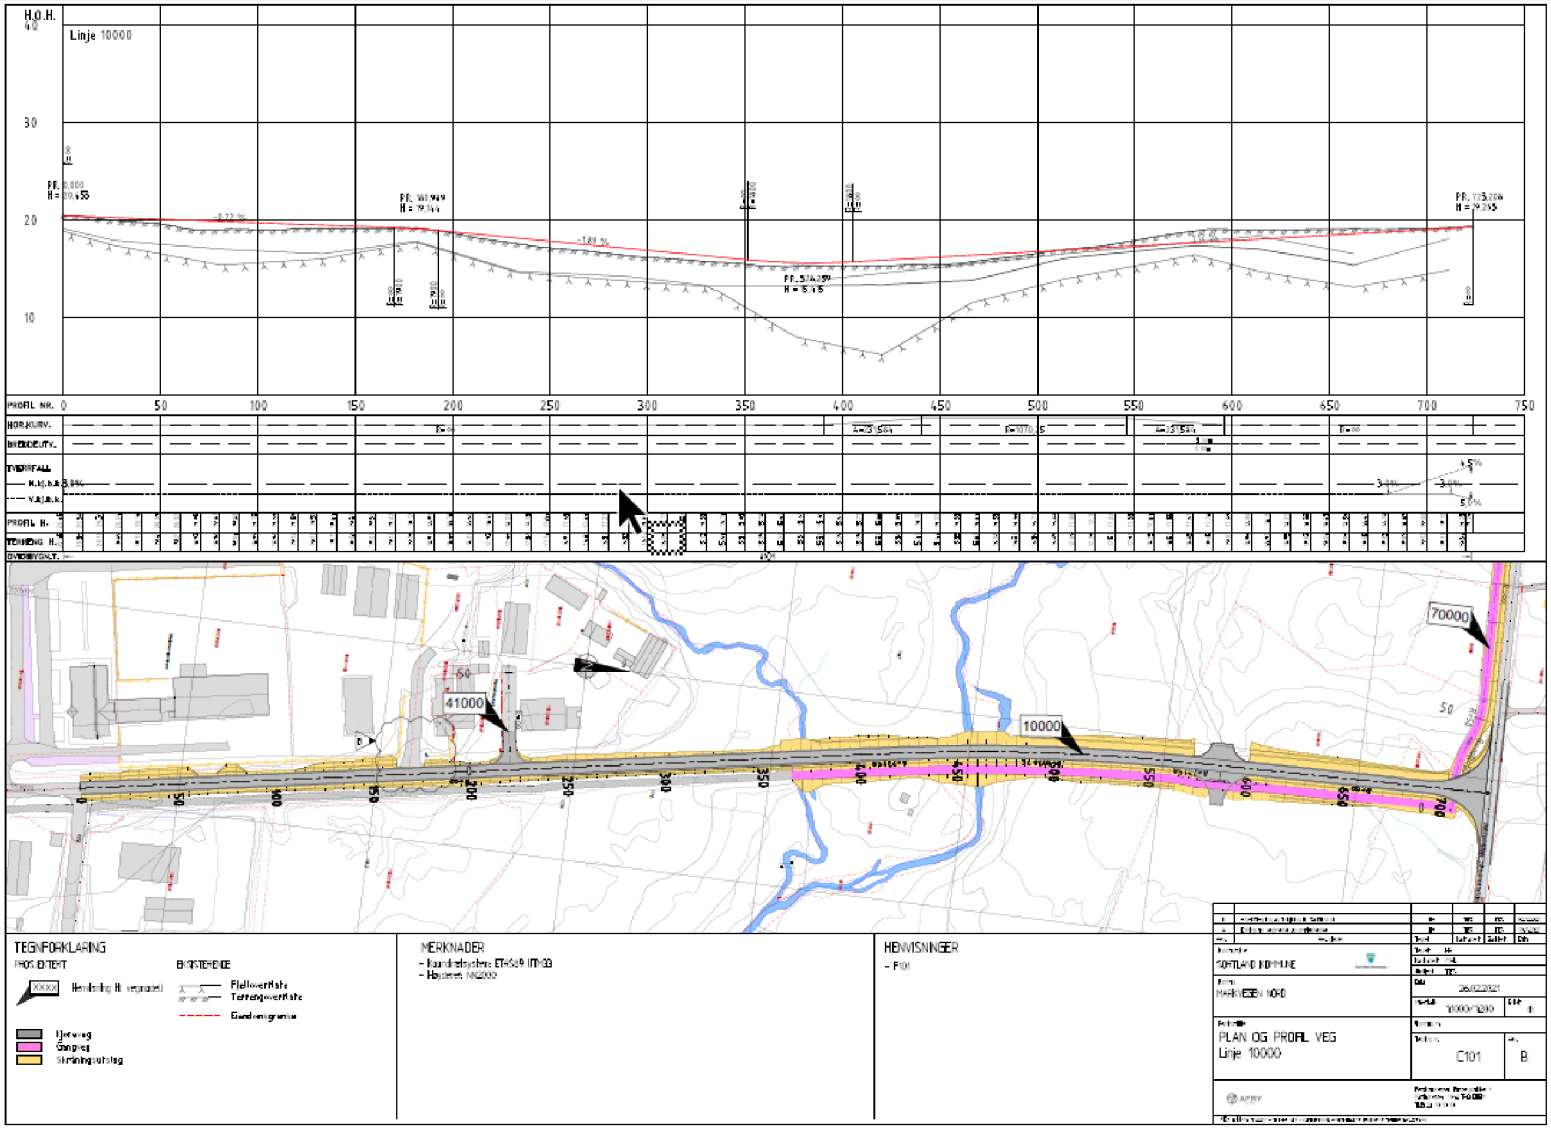

- Rikelig med utfordringer fra anleggsstart
- Eksisterende infrastuktur EL/HSP måtte først omstendelig omlegges/bygges ny, da vårt arbeidsområde i denne kontrakten krysses av majoriteten av strømforyning av Sortland sentrum.
- Vei fra kryss verkstedvei til forbi Selneselva kulvert planlegges asfaltert i uke 35, 2023. Her blir da både hovedveg , GS-veg inkl belysning etablert.
- Manglende erverv av areal til GS-veg, nord for Litleelva påvirker markant fremdrift. Kun vegkropp blir masseutskiftet, av det totale vegtverrsnittet. Her planlegges midlertidig oppbygning, med midlertidig slitelag på masseutskiftet planum, og deretter midlertidig åpnet for ferdsel ila høst -23
- Videre fremdrift avventes inntil avklaringer om erverv foreligger
