
041 Kjempenhøy rundkjøring med følgeprosjekter

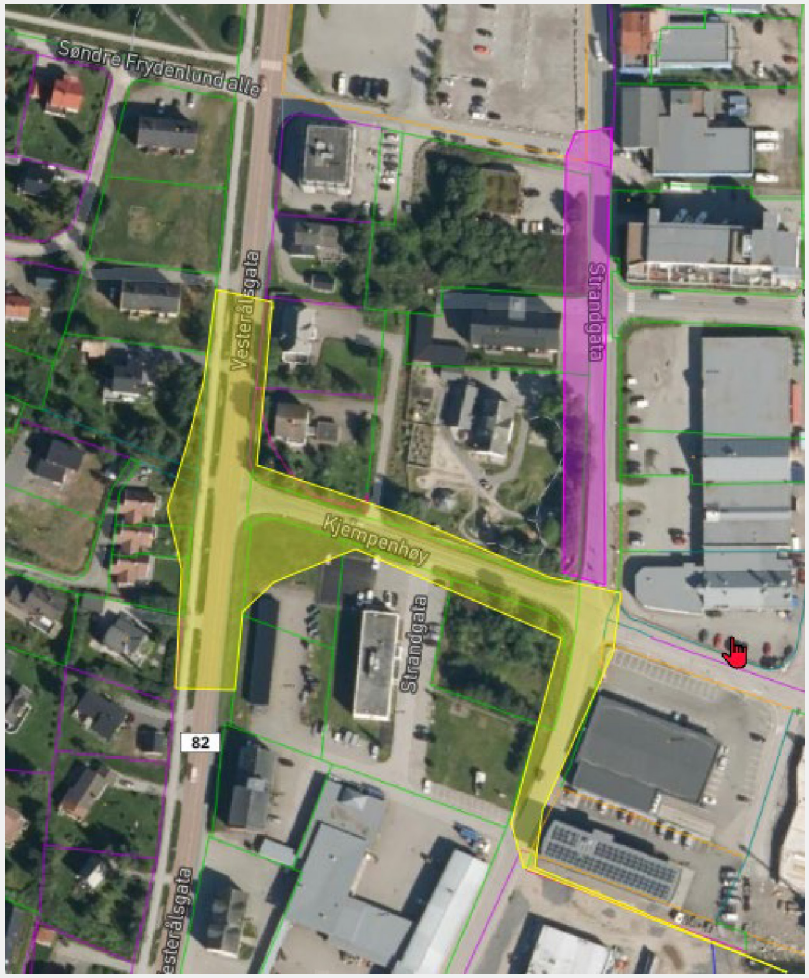


- Generalentreprise
- 30,5mill ex mva
- Hoveddel (gul)
- Opsjon (rosa)

Rosa del skulle vært med i kontrakt, men er angitt som opsjon, pga uavklart erverv, som det arbeides løpende med løsning på.

blåbyen

Sortland kommune

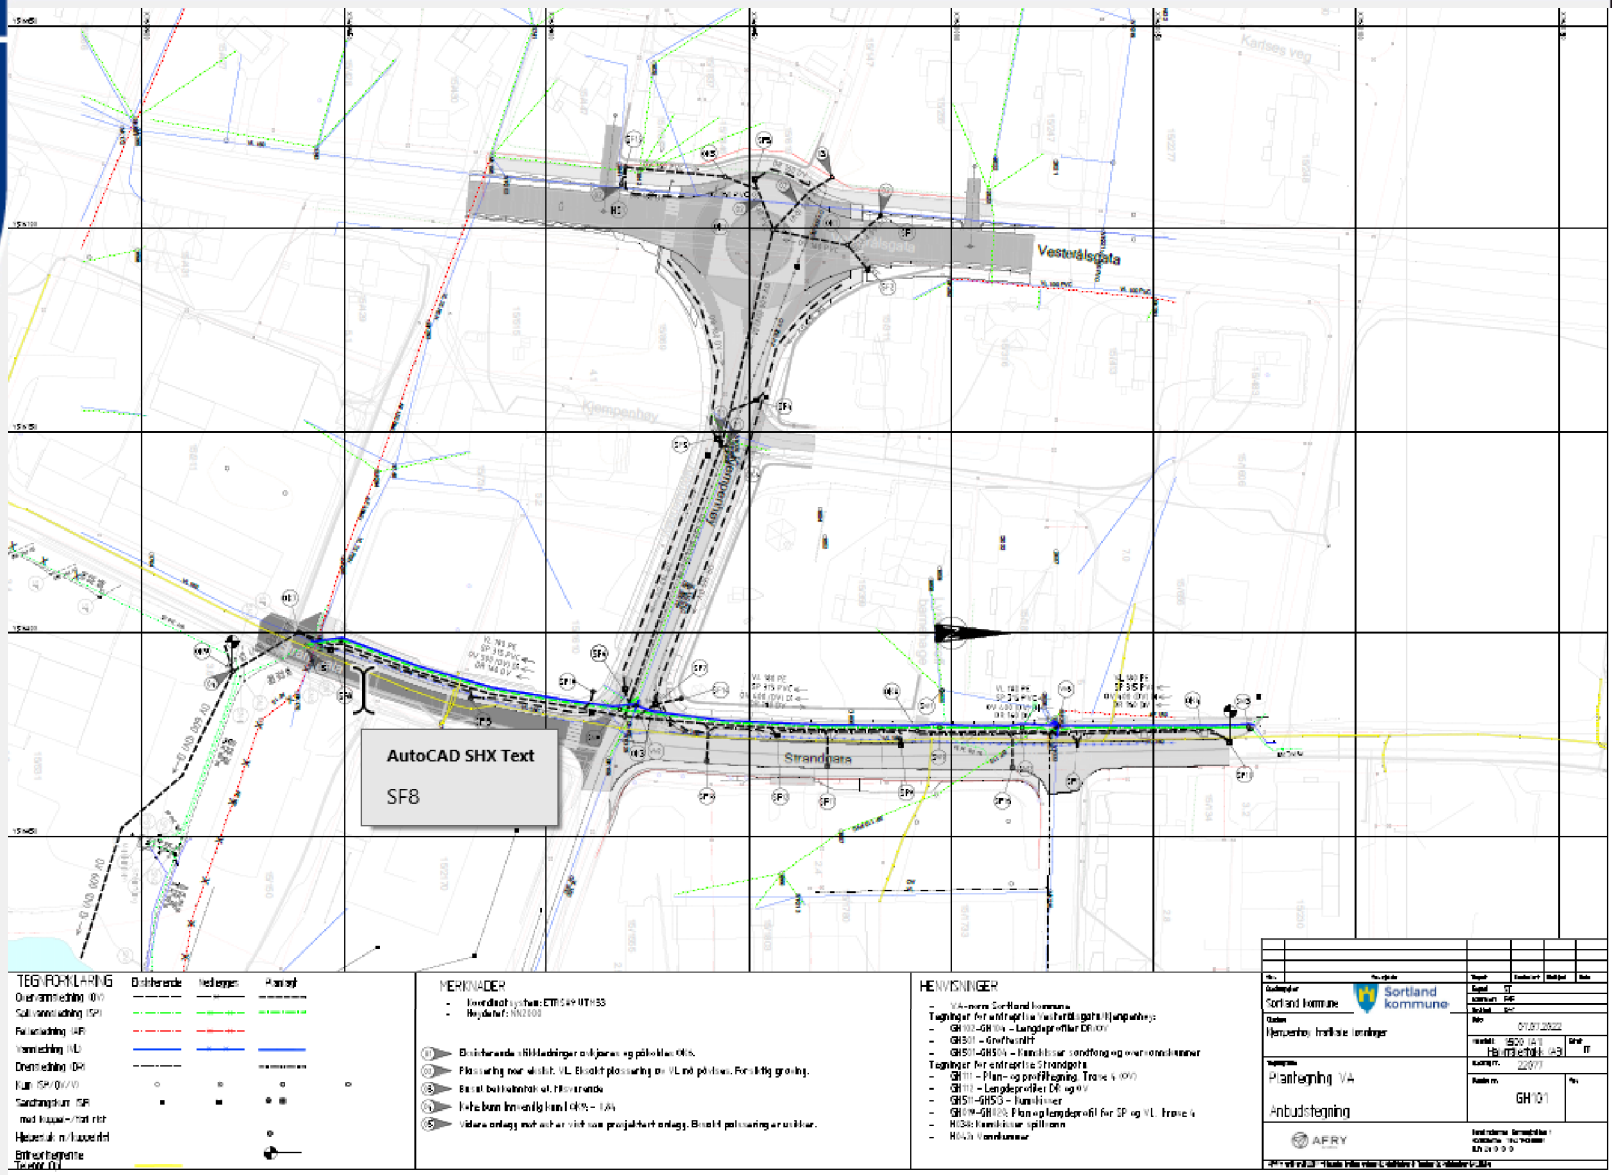

TEGNFORKLARING

MERKNADER

HENVISNINGER

Sortland kommune

Hjemmelsforhold tomter

Plantegning VA

Anbudstegning

GH101

blåbyen

Sortland kommune

- Arbeider fullført i Strandgata til og med Kjempehøy kryss. (VA og Vei/fortau)

- Arbeid pågår nordover i Strandgata, mot kryss Søndre Frydenlund/Strandgata
- Arbeider pågår parallelt opp Kjempenhøy, VA/el, masseutskifting. Forberedelser for planlagt oppstart rundkjøring vår-24

- Det prioriteres å få etablert VA komplett i Strandgata, bygge fortau, for dernest å få renovert vegoverflata i Strandgata, med ny oppbygning og asfalt før vinter 23/24.
- Dernest prioriteres å midlertidig sammenkoble Kjempenhøy /Vesterålsgata før vinter 23/24, samt fortau på Kjempenhøys sørside.
- Det planlegges å fortsette med rundkjøring vår -24, med fullføring høst -24

blåbyen

Sortland kommune

Kjempenhøy rundkjøring



(18.07.2023)
Sortland kommune skal bygge rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og startet januar 2023 med et VA-anlegg i Strandgata. I løpet av første halvår 2023 bygges Kjempenhøy mellom Strandgata og Vesterålsgata fram mot ny rundkjøring. Andre halvår 2023 gjøres forberedende arbeider for alternativ tilkomst til Lykkentreff barnehage, og i Strandgata fra Kjempenhøy frem mot Søndre Frydenlund fortsetter arbeidene i grunnen og med nye overflater.

Rundkjøringen i Vesterålsgata bygges første halvår 2024 etter avklaring med veieier Nordland fylkeskommune.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

blåbyen
