Bjørklundveien


Orientering – formannskapet

21.03.2024

blåbyen

Sortland kommune

Bjørklundveien – Vesterveien
Bjørklundveien – FV 82

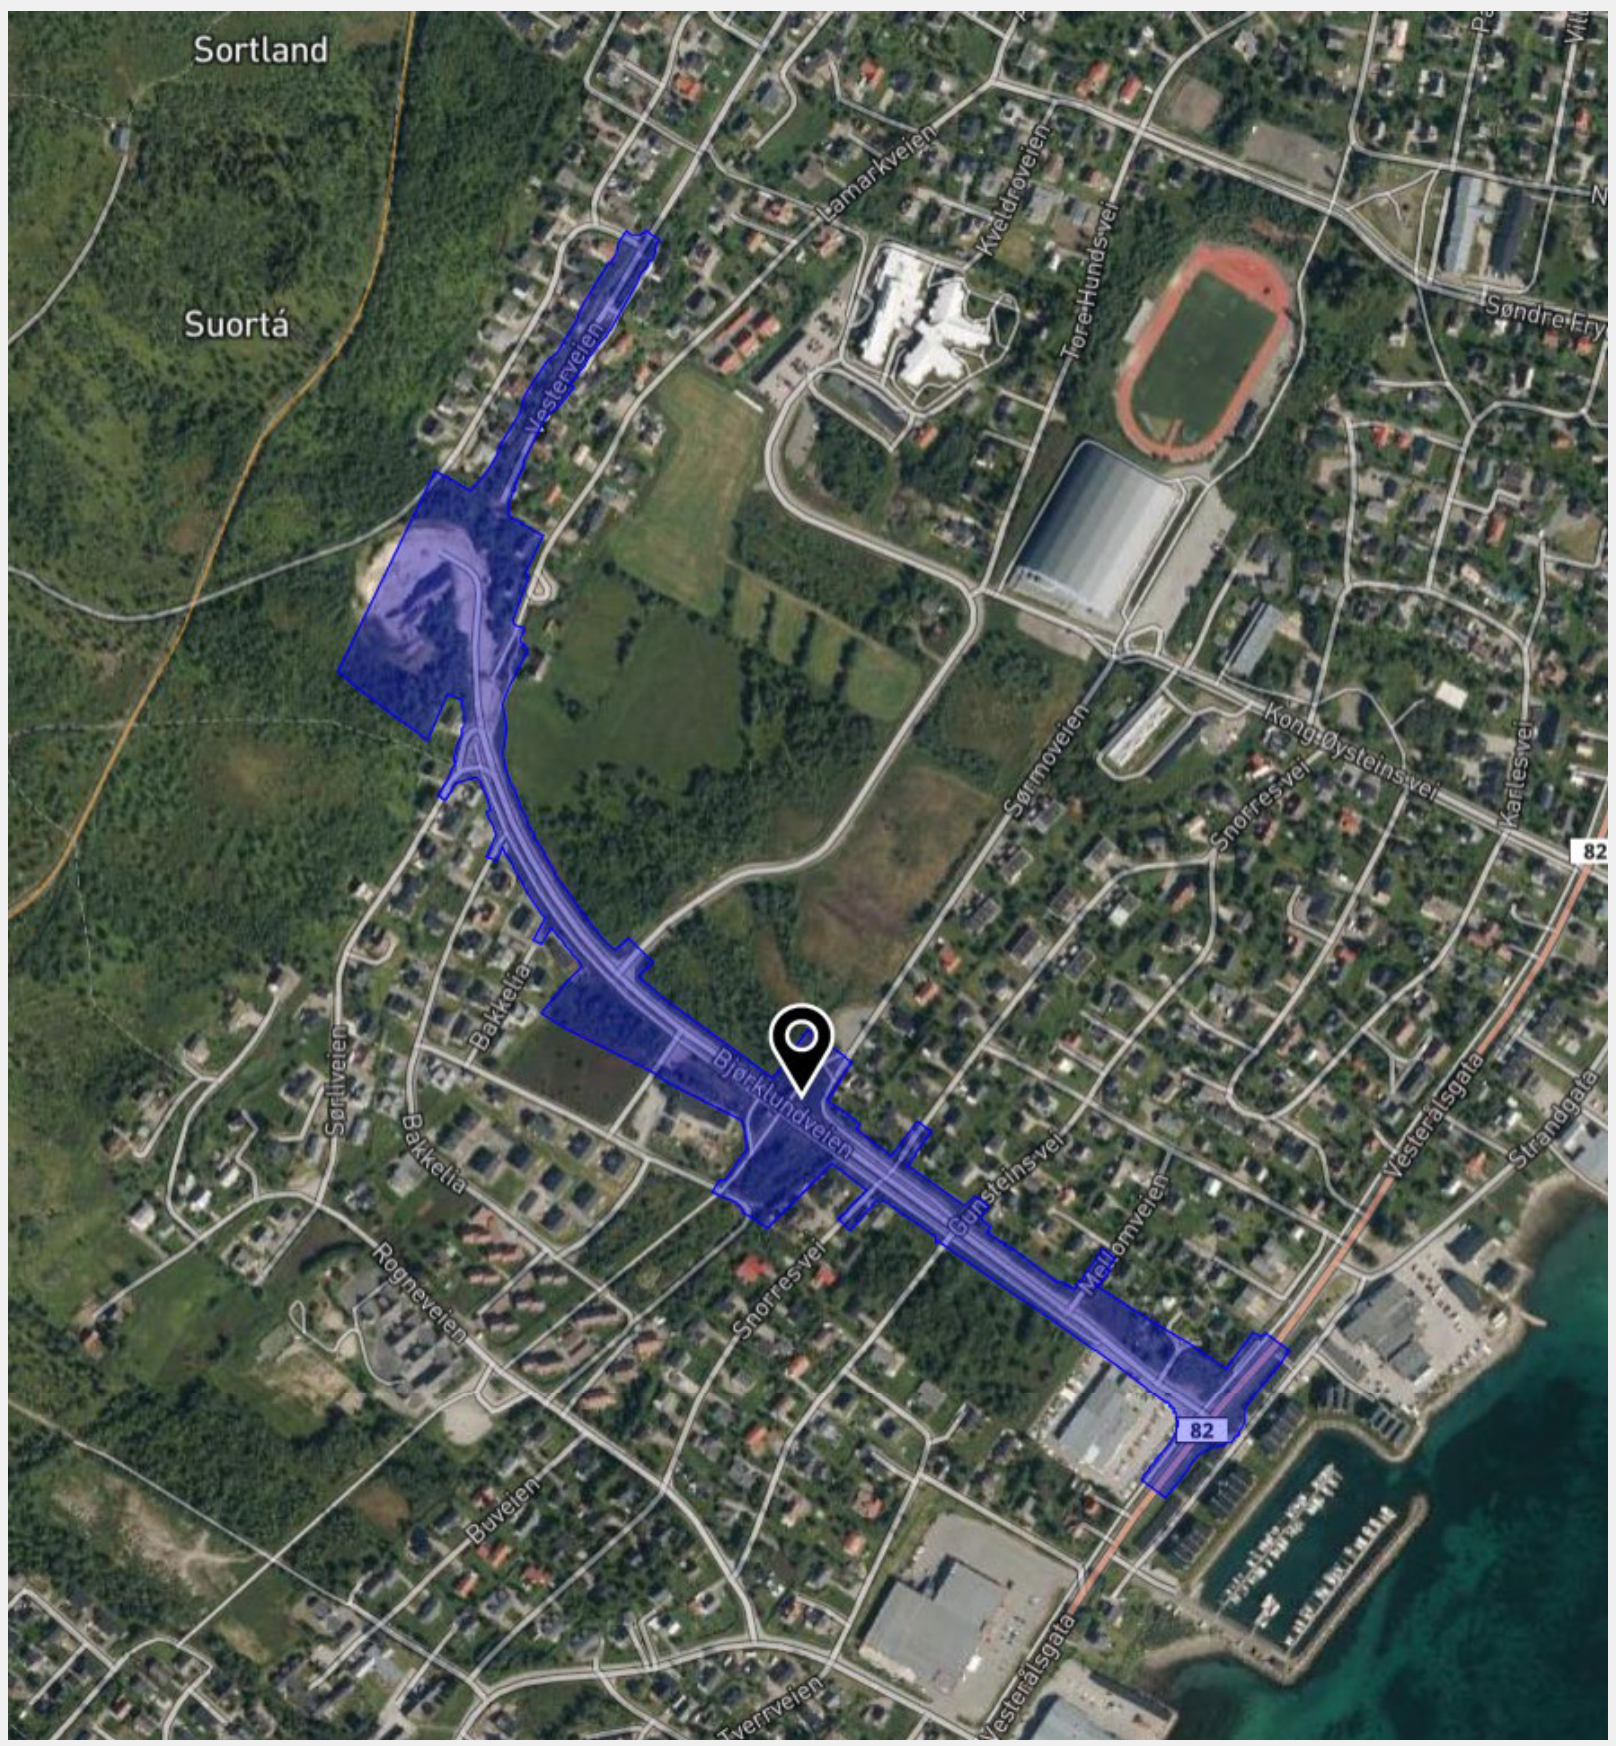


- Reguleringsendringen for sammenkoblingen – klagebehandles for FS 11.04.2024
- Reguleringsplan for nedre del – er i produksjon

blåbyen

Sortland kommune

Sammenkoblingen Bjørklundveien Vesterveien

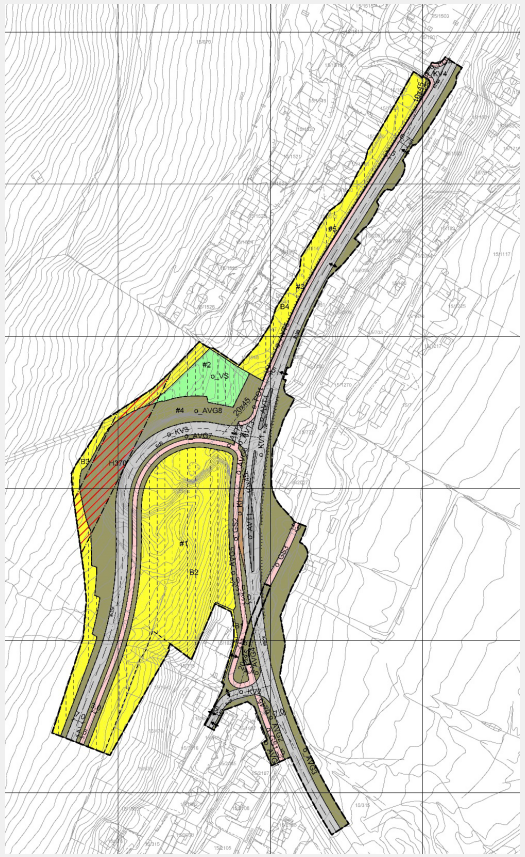


- Kontraktsinngåelse for detaljprosjektering ila. april
- Etter oppstart prosjektering – ny dialog med grunneiere
- Når løsningene for utførelse er etablert starter arbeidet med nødvendig erverv av arealer og arbeidsavtaler

blåbyen

Sortland kommune

Bjørklundveien kryssløsning Vesterålsgata

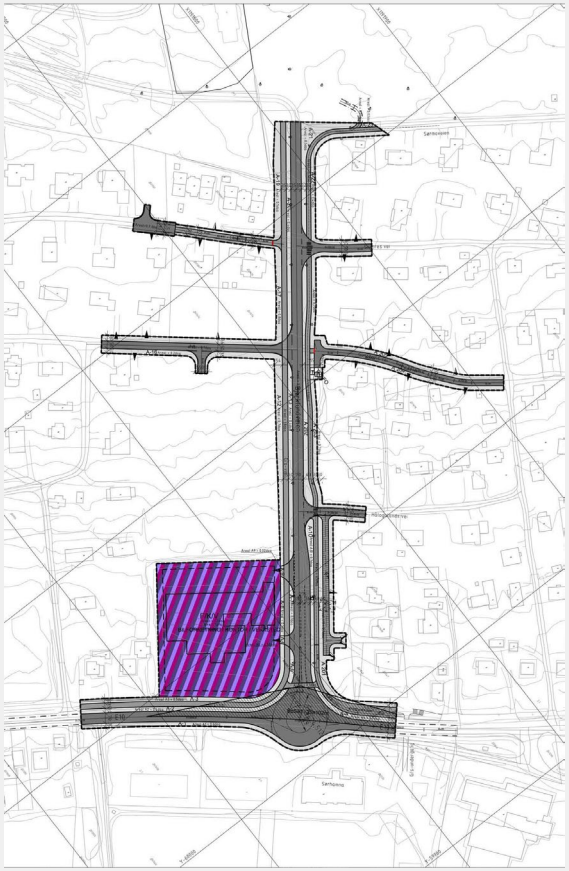

- Kontrakt for regulering inngått august 2023
- Arbeider nå for å avklare kryssløsning
- Planlagt innsending av endelig planforslag til administrasjonen juni 2024
- Planlagt politisk behandling sep/okt -24
- Endelig vedtak nov/des -24

blåbyen

Sortland kommune
