Ny flerbrukshall

Endrede premisser – FS-møte 02.02.23

Behov for ny forankring hos styringsgruppen

Mål: best mulig anlegg for flest mulig brukere

Bo- og bli-attraktivitet - FREMDRIFT

Redusere risiko, forenkle

blåbyen

Sortland kommune


Prosess frem til nå

- Parallelloppdrag- Vedtak i KS 05.05.22 - Lamarka
- Prosess, mandat og organisering FS 02.06.22
- Oppstart regulering FS 22.06.22
- Innspill fra Statsforvalter og fylkeskommune frist 23.09
  - KU og alternativs-vurdering
  - Klimautslipp umiddelbart og gjennom livsløpet
  - Risiko for innsigelse i reguleringssaken
  - Orientering i FS i oktober
- Oppstarsmøter i begge prosjektgruppene i oktober.
- Budsjett og økonomiplan – des-23
  - Hall prioriteres – prosess igangsatt- tverrfaglig PG



blåbyen


Prosess skole og hall

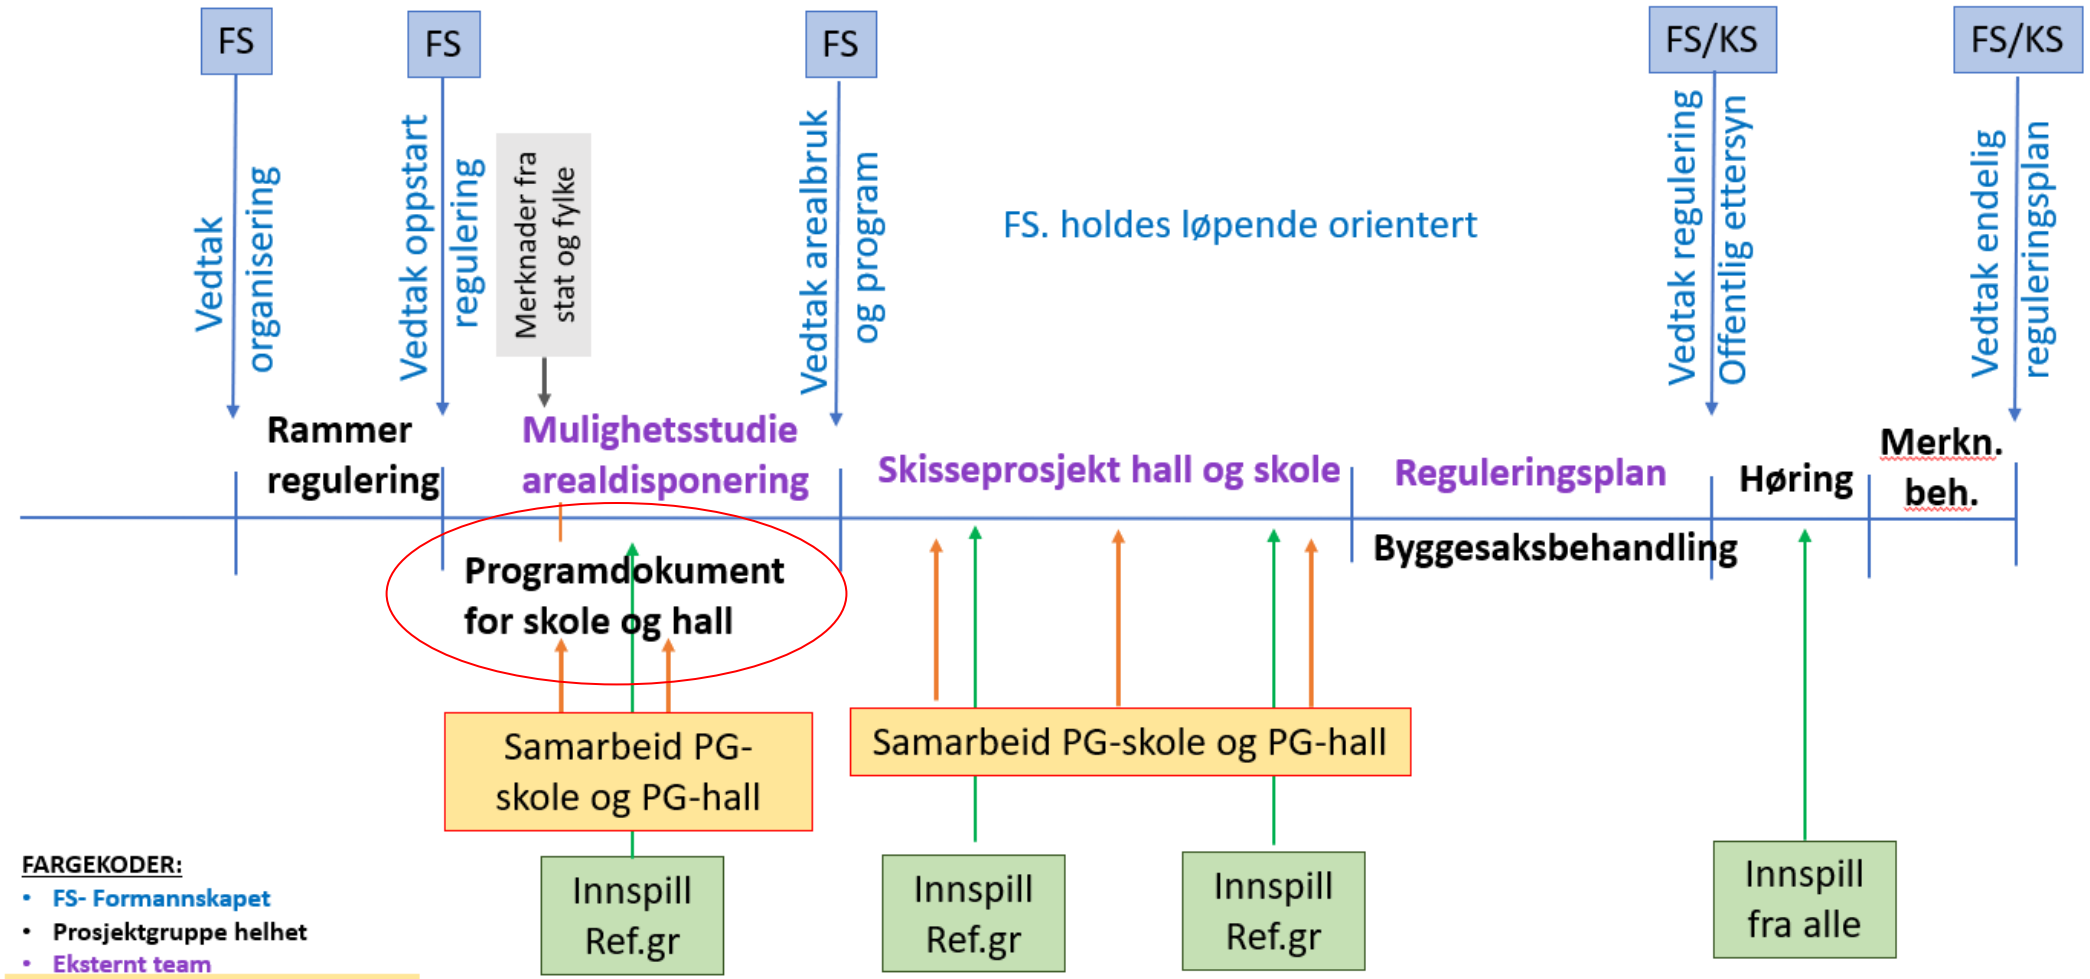

blåbyen

Sortland kommune


Prosess programdokument- forslag

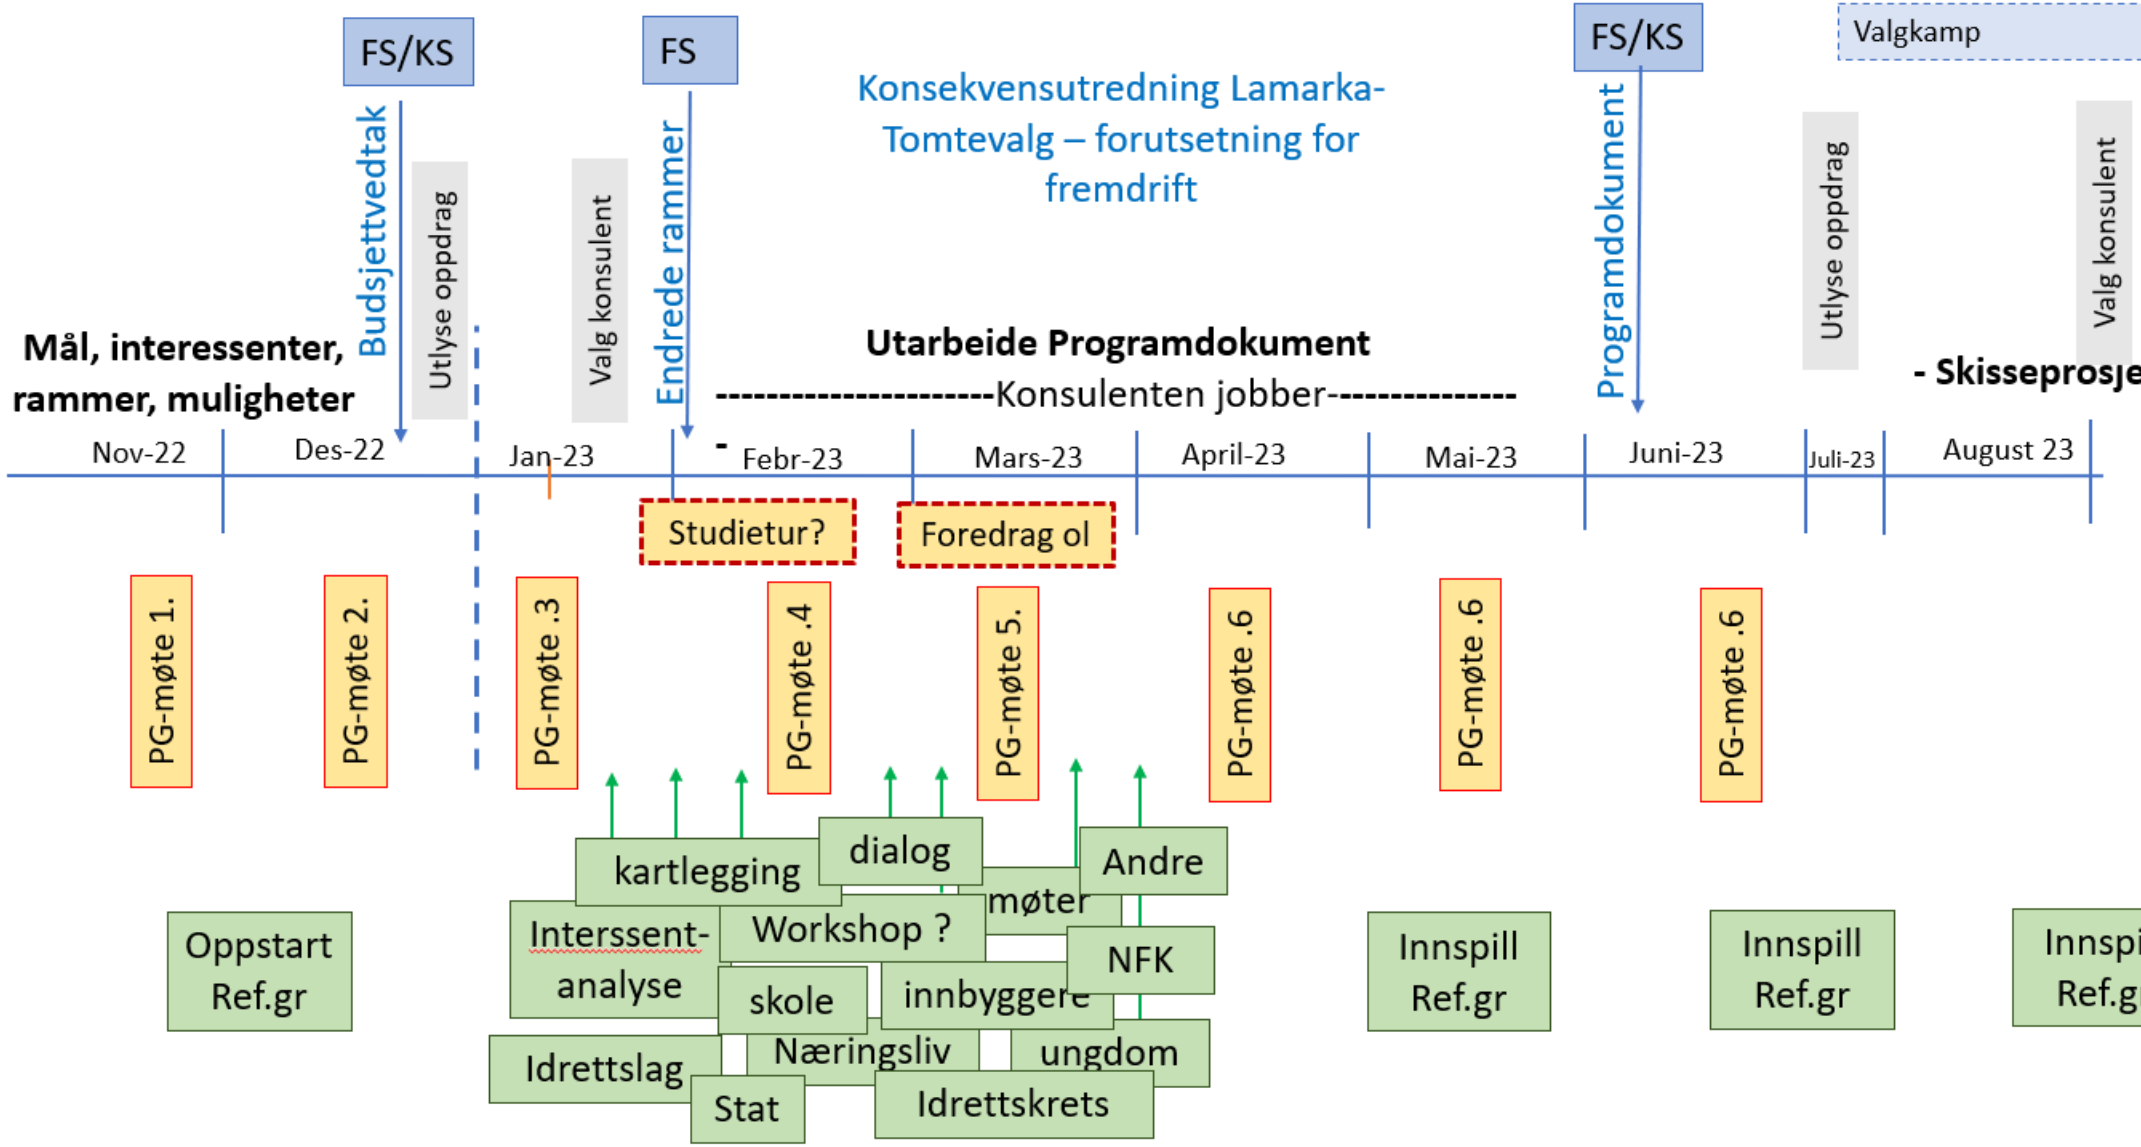


blåbyen

Organisering

Ny organisering

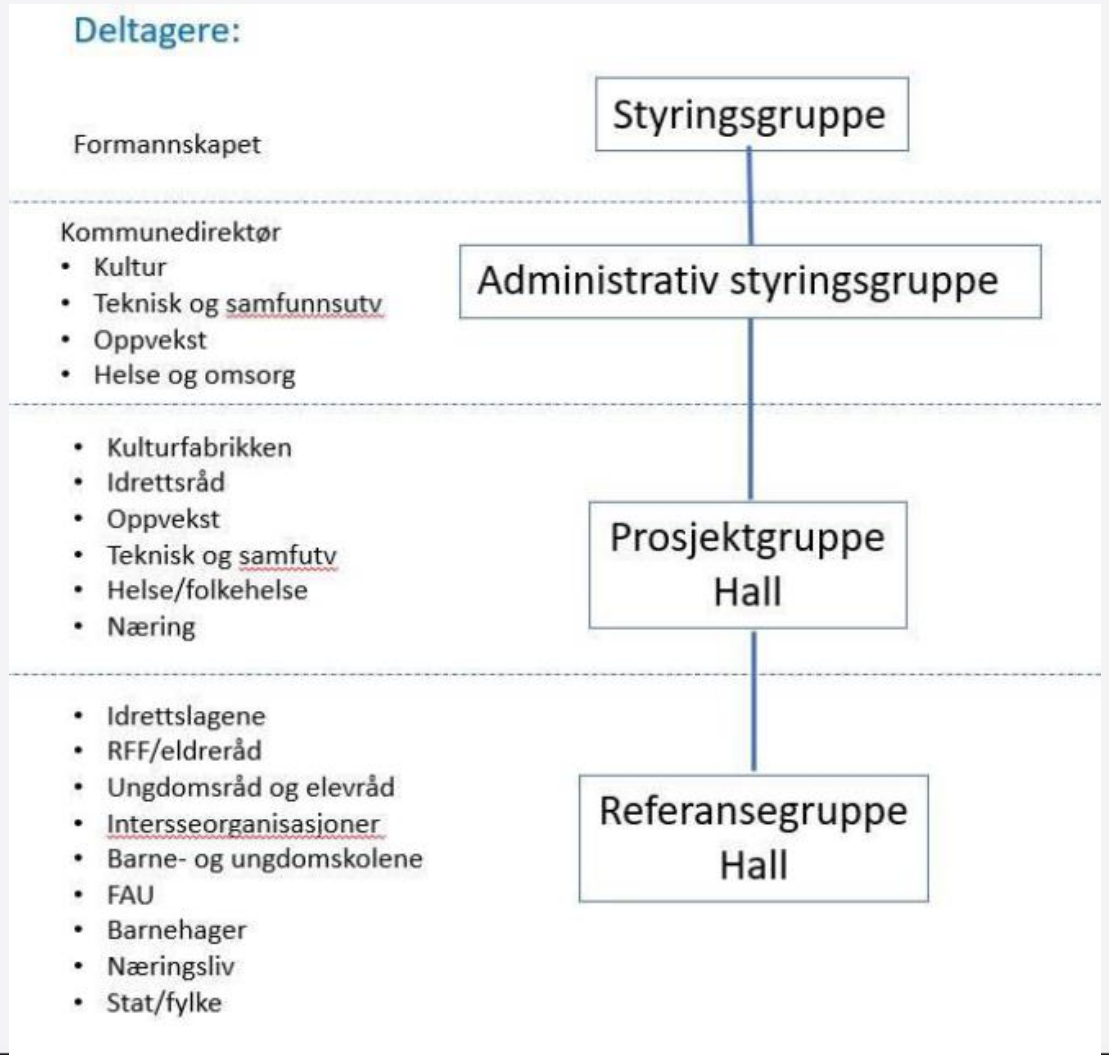


Vedtatt organisering

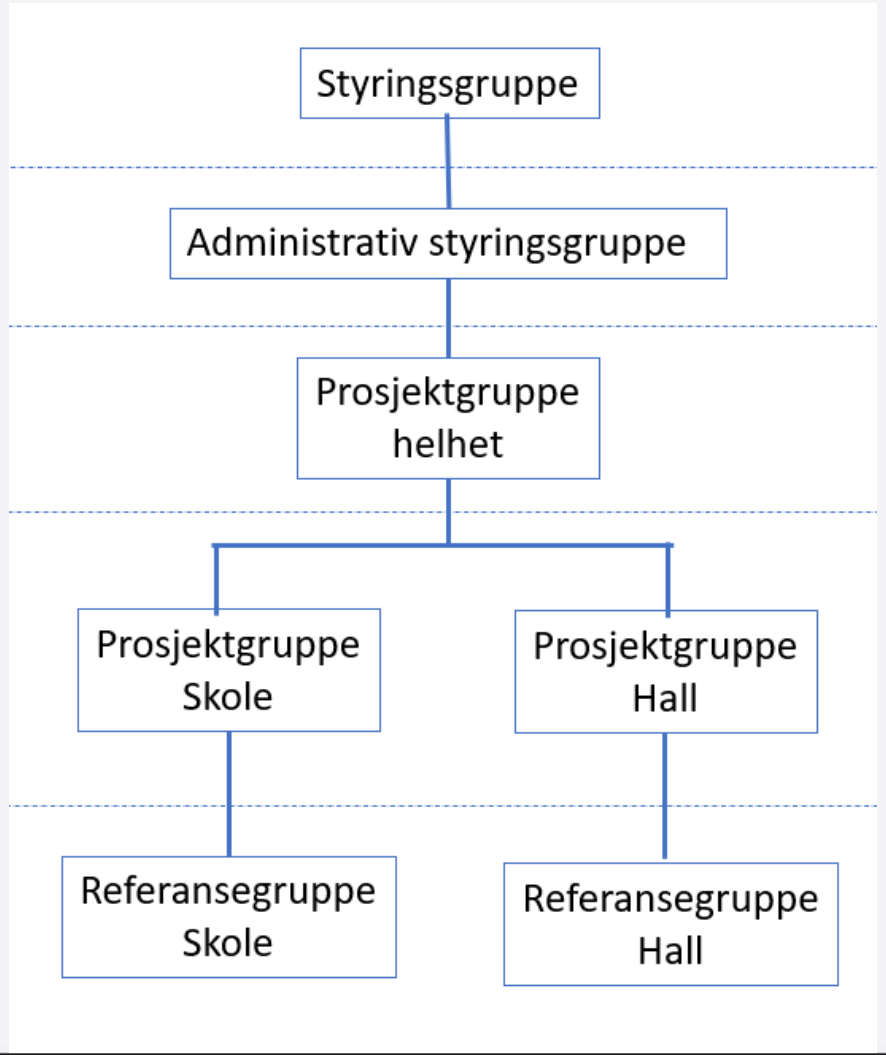


blåbyen

Regulering

- Avgrensing av området slik at det sikrer areal til fremtidig idrettsanlegg og skole
- Regulering er startet opp, det er enkelt å redusere området.
- Mindre risiko for innsigelse
- Privat grunneier ønsker oppstart
- Naturlig å se på hele området i forbindelse med revisjon av Byplan

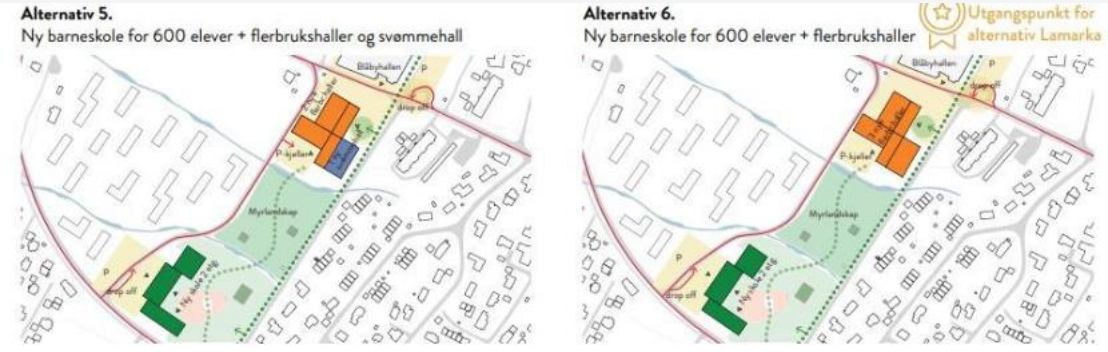


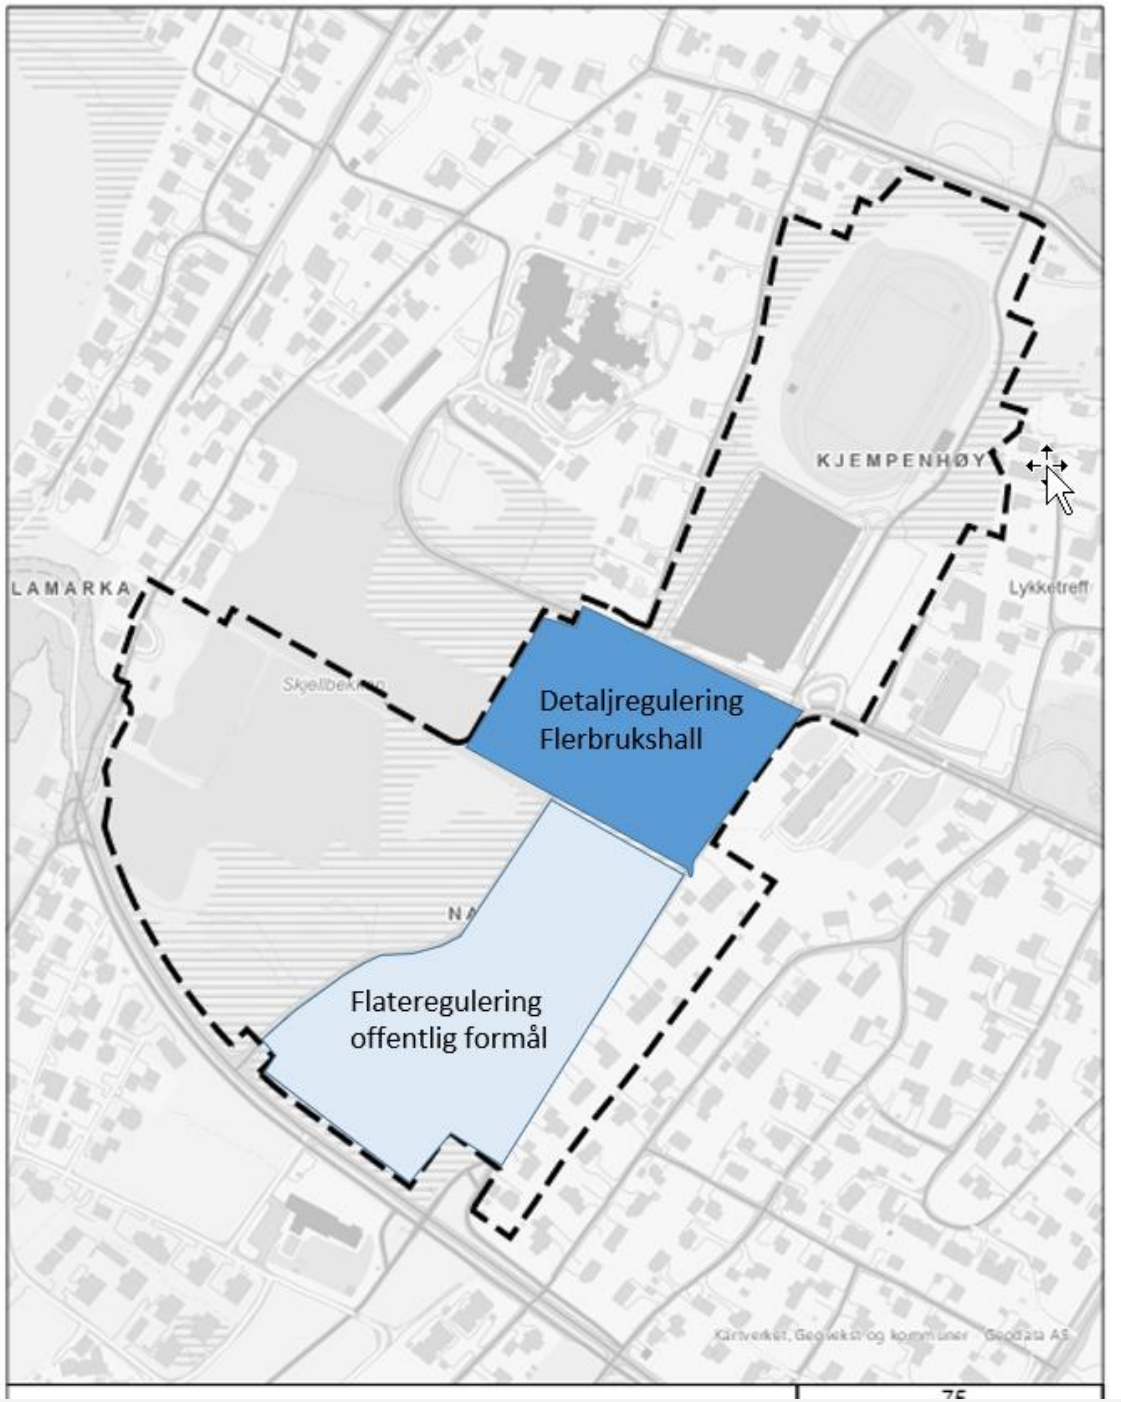


Plassering

- Statsforvalterens merknad
  - Alternativsvurdering plassering
  - CO2 utslipp og klima og miljøplan
- Fremdrift svømmehall, turnerne, oppgradering av Sortlandshallen mm.

Endrede forutsetninger gjør at vi anbefaler at vi ser på muligheter og begrensinger for et nytt anlegg, med fokus på å finne en lokalisering som gir størst bærekraft både for brukerne av anlegget, men også økonomisk og i et fremtidsrettet perspektiv (dette er ikke en omkamp)

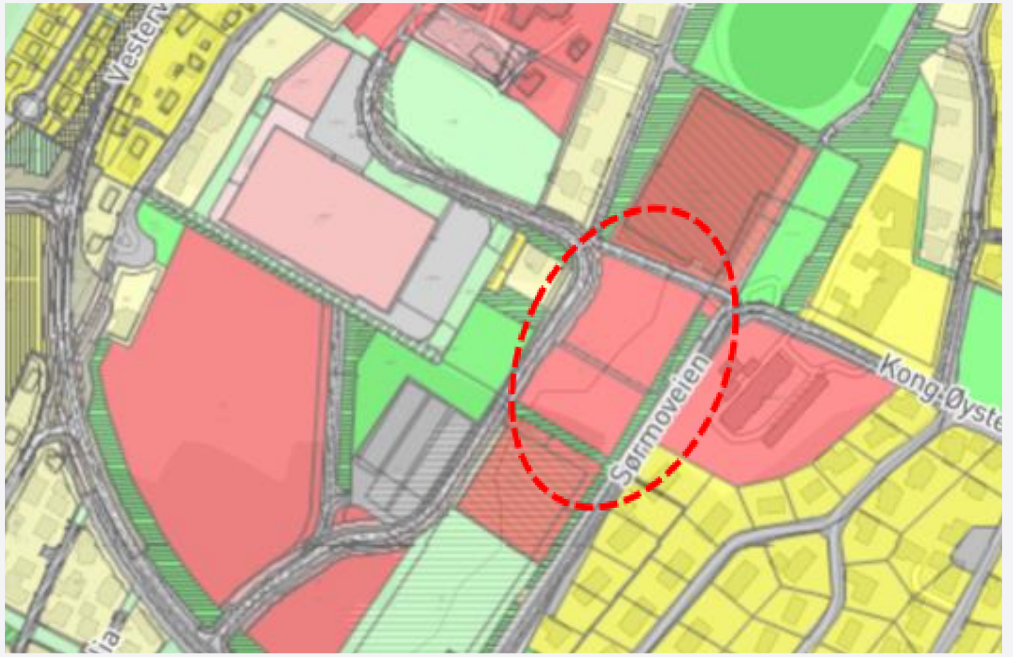

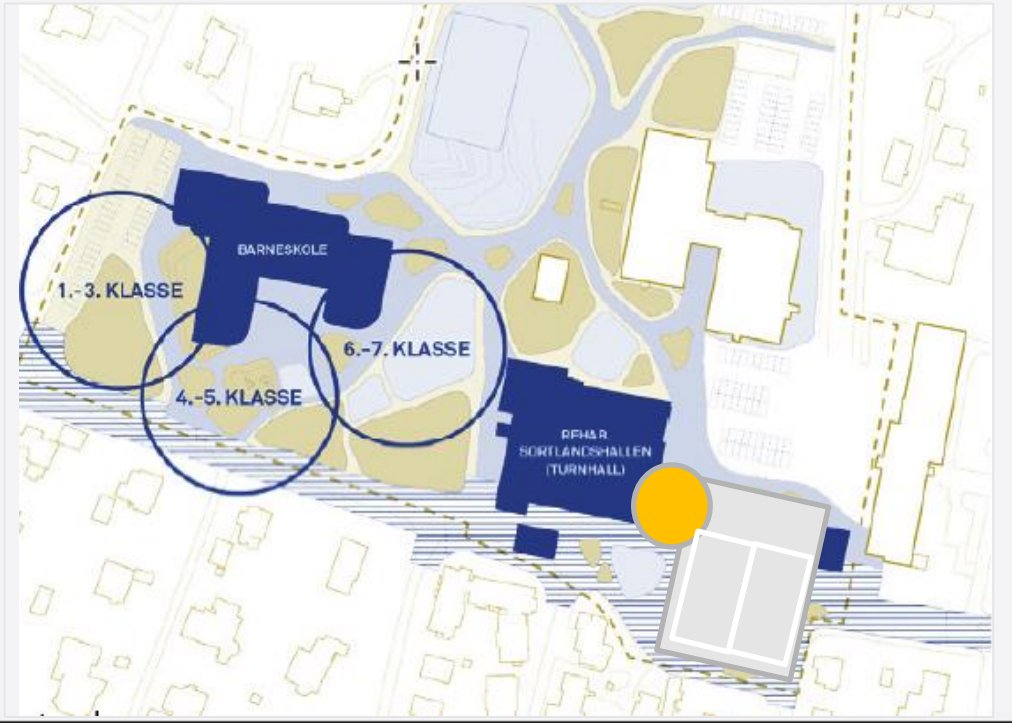

blåbyen

Programdokument

grunnlag for skisseprosjekt

- Visjon og mål – PG har jobbet godt
- Program – innhold
- Driftsformer
- Finansiering

Vi samarbeider med ekstern rådgiver for å finne smarte og bærekraftige løsninger (som Kulturfabrikken)






blåbyen

Arena Vesterålen arbeidstittel

- Forslag fra tverrsektoriell prosjektgruppe
- Synliggjør bredden, inkluderer i tidlig fase
- Enkel, tydelig og gjenkjennelig
- Endelig navn- del av medvirkningsprosessen
- Politisk behandles

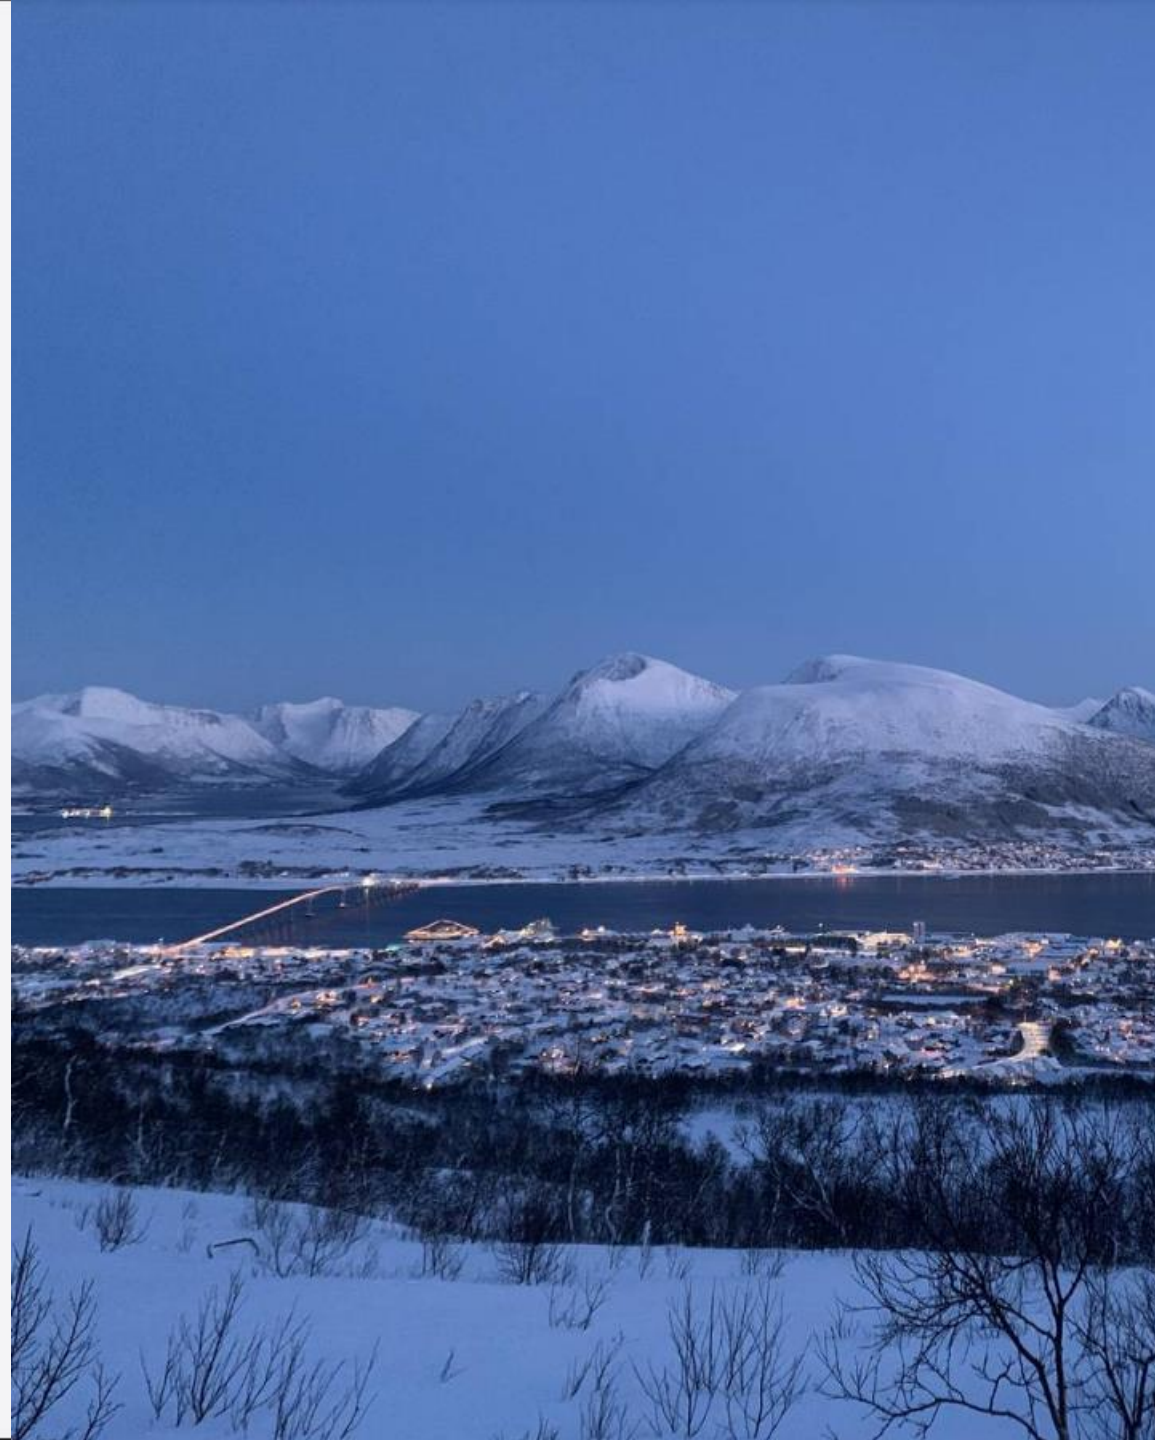

blåbyen
